

# 51. Sitzung des Forum Pergolenviertel am 05.11.2024

## Protokoll

18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Gemeinschaftsraum Loki-Schmidt-Platz 11

ca. 60 Teilnehmer:innen

## Inhalt

1. Einführung
2. Aktuelles aus dem Viertel
3. Informationen zum Straßenbau Feldahornweg
4. Planungen des Spielplatzes und des Angers
5. Aktuelles aus der „Aktivengruppe“
6. Anträge an den Verfügungsfonds
7. Termine und Sonstiges

## 1. Einführung

Eva Koch und Tobias Kulzer begrüßen die Teilnehmer:innen des 51. Forums Pergolenviertel. Eine kurze Abfrage ergibt, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer:innen zum ersten Mal am Forum teilnehmen. Etwa drei Viertel der Teilnehmer:innen wohnen im Feldahornweg. Von Seiten des Bezirksamtes nehmen Herr Dreher (Fachamt Sozialraummanagement) sowie Herr Koenig und Herr Kinkel (beide Fachamt Management des öffentlichen Raumes) teil.

## 2. Aktuelles aus dem Viertel

[Bericht vom Apfelfest am 21.09.](#)

Ende September fand im Kleingarten des Projektes „Lokis Blumenwiese“ zum zweiten Mal ein Fest rund um den Apfel statt. Etwa 90 Nachbar:innen aus dem Pergolenviertel feierten bei bestem Herbstwetter. Viele Äpfel wurden geerntet und gleich verzehrt, unter anderem mit Schokolade vom Schokobrunnen, der insbesondere

bei den Kindern sehr gut angekommen ist. Darüber hinaus bot das Fest viel Raum für nachbarschaftliches Kennenlernen und Austausch. Das Fest wurde mit 400 Euro aus dem Verfügungsfonds unterstützt.

#### Bericht von der „Frühblüher“-Pflanzaktion am 19.10.

Im Rahmen einer Nachbarschaftsaktion wurden rund um das Gebäude auf dem Baufeld 2a (ganz im Norden des Winterlindenweges) rund 1.500 Blumenzwiebeln gepflanzt, die das Grundstück im kommenden Frühjahr in ein buntes Blütenmeer verwandeln werden. Auch diese Aktion wurde mit 250 Euro aus dem Verfügungsfonds unterstützt.

#### Bericht vom Bepflanzen der Hochbeete auf dem Loki-Schmidt-Platz

Eine engagierte Gruppe pflanzenbegeisterter Nachbar:innen hat die beiden fest installierten Hochbeete auf dem Loki-Schmidt-Platz bepflanzt. Die Aktion wurde mit 300 Euro aus dem Verfügungsfonds unterstützt. Die Beete sollen langfristig von der Nachbarschaft gepflegt werden. Perspektivisch wird noch ein drittes Hochbeet auf dem Platz zur Verfügung stehen, in dem derzeit noch ein Baum gepflanzt ist, der zum Dakarweg verpflanzt wird. Ein großer Dank an alle, die sich an der Umsetzung der tollen Verfügungsfonds-Projekte beteiligt haben!



#### Das Projekt PERIGON feiert Richtfest

Am 18. September wurde bei strahlendem Sonnenschein Richtfest für das letzte im Bau befindliche Gebäude gefeiert, das den nördlichen Abschluss des Pergolenviertels bilden wird. Im Sommer nächsten Jahres sollen die Wohnungen bezogen werden. Das Gebäude wird vielfältige Nutzungen beherbergen: Neben 78 Mietwohnungen und 81 Apartments entstehen im PERIGON Wohnplätze für rund 200 Studierende sowie 20 Wohnungen im Programm "Hier wohnt Hamburgs Jugend", das jungen Menschen, die aus betreuten Jugendhilfeeinrichtungen ausziehen, Wohnraum zur Verfügung stellt. Außerdem ziehen die Kindertagesstätte EMILY mit 100 Plätzen, eine Arztpraxis sowie ein Supermarkt ein, der nicht nur das Pergolenviertel, sondern auch die umliegenden Quartiere versorgen wird.



steg Hamburg mbH im Auftrag des Bezirksamts Hamburg-Nord

### Spendengelder an Mutter-Vater-Kind-Einrichtung übergeben

Beim Kuchenverkauf im Rahmen des Sommerfestes am 31. August kamen Spenden in Höhe von über 300 Euro zusammen. Diese wurden an die Mutter-Vater-Kind-Einrichtung des Sozialdienstes der katholischen Frauen (SkF) im Feldahornweg übergeben. Claudia Schäferkordt vom SkF, Leiterin des Anna und Elisabeth Zillken-Hauses, und die Bewohner:innen der Einrichtung freuen sich sehr über die Spende, von der unter anderem neue Spielsachen angeschafft werden. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!



### Zukunft des mobilport

Das Verleihangebot wird in der jetzigen Form nur noch bis Mai nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Auch wenn die Nutzungszahlen gut sind, kann der Betrieb nur aufrechterhalten werden, weil er in erheblichem Umfang durch so genannte Bauherrngelder (Gelder, die von den Bauherren beim Grundstückskauf in einen Fonds eingezahlt wurden) subventioniert wird. Diese Gelder sind leider begrenzt und sollen für Projekte verwendet werden, die möglichst vielen Bewohner:innen des Pergolenviertels langfristig zugute kommen. Das Angebot des mobilport wird nur von einer relativ kleinen Gruppe regelmäßig genutzt. Zudem zeigt sich, dass der private Besitz von Lastenrädern im Pergolenviertel deutlich zugenommen hat, so dass der Bedarf an einem solchen Verleihangebot zurückgegangen ist. Dennoch wäre es wünschenswert, das Verleihangebot in modifizierter Form aufrecht zu erhalten. Am 10. Oktober fand ein erstes Treffen mit den Nutzer:innen statt, die das Angebot regelmäßig nutzen, um zu überlegen, wie der Betrieb auf nachbarschaftliche Art und Weise weitergeführt werden kann. Sollte sich keine Lösung abzeichnen, wäre auch eine Spende der Räder an soziale Einrichtungen im Stadtteil denkbar. Wer sich an den Überlegungen zur Zukunft des mobilport beteiligen möchte, kann sich unter [pergolenviertel@steg-hamburg.de](mailto:pergolenviertel@steg-hamburg.de) melden.

## **3. Informationen zum Straßenbau Feldahornweg**

Herr Koenig vom Fachamt Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Hamburg-Nord stellt den Bauablauf der Straßenbaumaßnahme Feldahornweg vor. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Präsentation zu entnehmen.

Aufgrund der Verzögerungen im Straßenbau wird die Maßnahme im Bezirksamt nun mit hoher Priorität behandelt. Die Baumaßnahme wird in Kürze ausgeschrieben, der Baubeginn ist für Anfang 2025 vorgesehen. Für die gesamte Straßenbaumaßnahme sind ca. 25 Wochen Bauzeit vorgesehen. Auch wenn es seitens des Bezirksamtes gewisse Vorgaben zum Bauablauf gibt, ist dieser im Detail mit der Baufirma abzustimmen und hängt

u.a. auch von der Witterung ab. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Asphaltierung in mehreren Abschnitten erfolgen kann, was zu mehreren Teilspernungen des Feldahornweges führen würde, oder ob die Asphaltierung in einem Zug erfolgen kann, so dass die Straße nur einmal, dafür aber komplett gesperrt werden muss.

#### Fragen und Anmerkungen seitens der Teilnehmenden

- Welche Geschwindigkeitsbegrenzung wird im Feldahornweg gelten?
  - Im gesamten Feldahornweg wird Tempo 30 gelten.
- Wie wird der Anschluss des Feldahornweges an die Alte Wöhr aussehen?
  - Der Bereich wird gepflastert, um optisch zu verdeutlichen, dass der Gehweg bei der Einfahrt in den Feldahornweg überfahren wird. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich eines Zebrastreifens an der Alten Wöhr (Querung zum Spielplatz im Stadtparkquartier)?
- Es wird darauf hingewiesen, dass der Fußweg von der Saarlandstraße kommend in den Feldahornweg nicht durchgängig ist. Es wird vermutet, dass der Fußweg an dieser Stelle wegen eines schützenswerten Baumes und wegen des Geländeversprungs nicht gebaut werden kann.
  - Herr Kinkel berichtet, dass der Baum in diesem Bereich nicht erhalten werden konnte und geprüft wird, inwieweit der Gehweg durchgehend gebaut werden kann. Grundsätzlich ist jedoch ein direkter Zugang zum Feldahornweg von der Alten Wöhr über die Treppe und die Räume (etwas weiter westlich) möglich.
- Es wird ausdrücklich gefordert, den Fußverkehr während der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen (Einrichtung von Halteverbotszonen und Aufstellung von beleuchteten Barken) zu sichern. Derzeit ist die Situation für Fußgänger:innen (insbesondere für Kinder und sehbehinderte Menschen) sehr unübersichtlich und gefährlich.
  - Das Bezirksamt bietet an, sich die Situation im Rahmen eines gemeinsamen Vor-Ort-Termins mit den Bewohner:innen des Feldahornweges anzuschauen, um besonders kritische Bereiche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die rasch (d.h. bestmöglich noch vor Beginn des Straßenbaus) umgesetzt werden können. Der Termin wird mit dem Bezirksamt abgestimmt und zeitnah durch das Quartiersmanagement über den E-Mail-Verteiler für Bewohner:innen kommuniziert.
- Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Saarlandstieg grundsätzlich eine sichere Fußwegeverbindung vom Feldahornweg zur Alten Wöhr besteht. Der Saarlandstieg weist jedoch zahlreiche große Schlaglöcher auf, in denen sich bei Regen tiefe Pfützen bilden, die den Weg nahezu unpassierbar machen.




- Herr Kinkel berichtet, dass die Schlaglöcher bereits verfüllt wurden, aber durch den starken Radverkehr entlang des Saarlandstiegs immer wieder neue Schlaglöcher entstehen. Nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen im Feldahornweg soll der Saarlandstieg durchgehend gepflastert werden. Es soll geprüft werden, inwieweit der Weg während der Baumaßnahme durch provisorische Maßnahmen sowohl für den Fuß- als auch für den Radverkehr dauerhaft passierbar gemacht werden kann.
- Es wird eine temporäre Beleuchtung des Feldahornweges gefordert.
  - Herr Koenig hat das Thema bereits im Bezirksamt bewegt. Eine Rückmeldung, inwieweit eine temporäre Beleuchtung umgesetzt werden kann, steht noch aus. Entscheidend ist, dass die technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind.
- Es wird darauf hingewiesen, dass die temporäre Beleuchtung entlang des Saarlandstiegs seit langer Zeit defekt ist.
  - In diesem Bereich ist es häufiger zu Vandalismus gekommen. Es wird veranlasst, dass die Beleuchtung wieder in Stand gesetzt wird.
- Es wird gefordert, dass der Feldahornweg im Winter auch während der Baumaßnahmen gestreut und geräumt wird.
  - Dies wurde bereits veranlasst.
- Eine Bewohnerin des Gebäudes auf Baufeld 10 berichtet, dass eine Bepflanzung des Walls zur Alten Wöhr, der sich auf dem Privatgrundstück befindet, geplant ist. Sie möchte wissen, wo die Grundstücksgrenze verläuft.
  - Herr Koenig weist darauf hin, dass die Grundstücksgrenze bis an die Rampe reicht, die im Rahmen der Straßenbauarbeiten am Feldahornweg gebaut wird. Er bittet, mit der Bepflanzung bis zur Fertigstellung der Rampe zu warten.
- Es wird darauf hingewiesen, dass die Beleuchtung der Veloroute unterhalb der Unterführung Hebebrandstraße defekt ist.
  - Die Zuständigkeit liegt bei den Hamburger Verkehrsanlagen. Herr Koenig wird den Defekt melden und eine Reparatur veranlassen.



## 4. Planungen des Spielplatzes und des Angers

### Anger

Herr Kinkel vom Fachamt Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Hamburg-Nord stellt den Entwurf für den Anger (Grünfläche nördlich des Baufeldes 9) vor. Der erste Entwurf wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Beteiligung vom September 2023 überarbeitet. Die Ideen und Wünsche der Beteiligten wurden geprüft und soweit möglich in den Entwurf integriert.

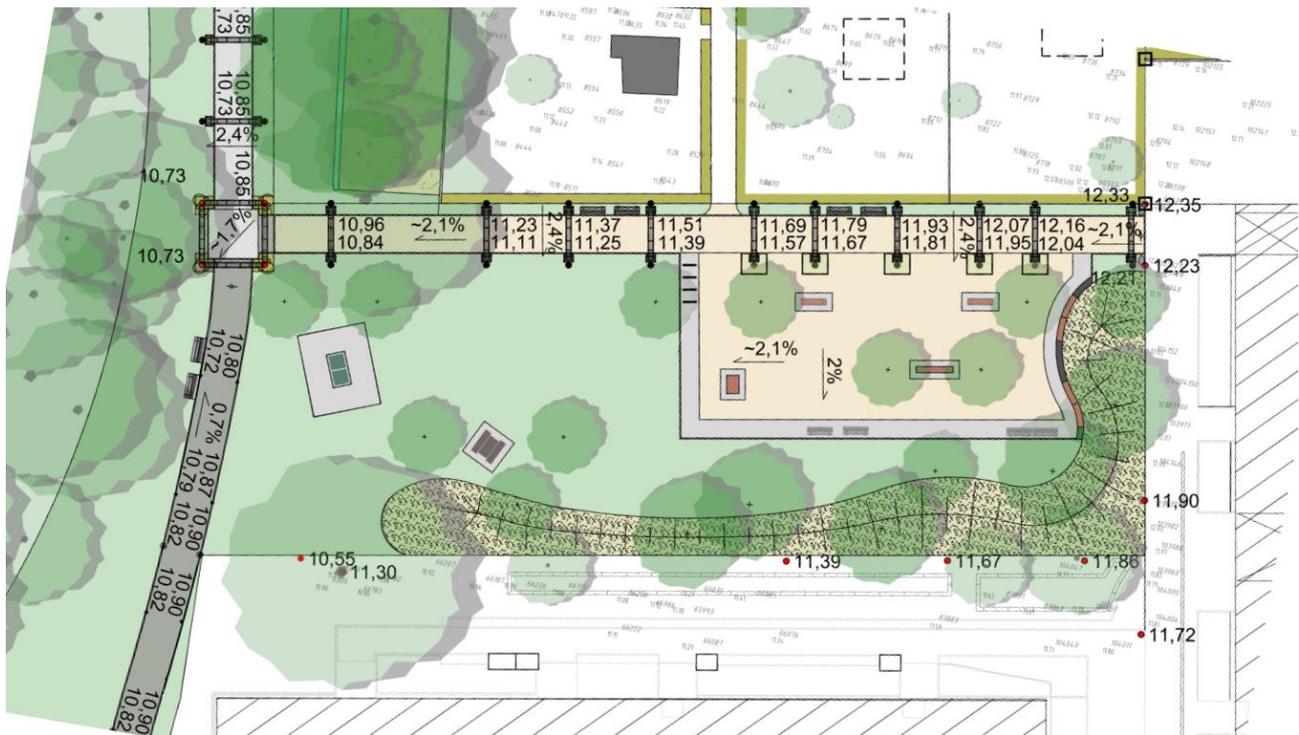

Der Erdwall, der den Anger zur südlich und östlich angrenzenden Bebauung abschließt, wird erhalten bzw. neu angelegt. Der Wall soll mit Gehölzen bepflanzt werden. Die ursprünglich geplante große Fläche mit Sitzgelegenheiten wird verkleinert und in den Nordosten des Angers verlegt. Sie wird von einem Pflasterband eingerahmt, an dem einige Fahrradbügel vorgesehen sind. Mehrere Bänke, die u.a. auch in eine Mauer entlang des Walls eingelassen werden, bieten zahlreiche Sitzmöglichkeiten. Da dies der sonnigste Bereich des Angers ist, werden zusätzlich schattenspendende Bäume gepflanzt. Der westliche Bereich des Angers wird als Grünfläche gestaltet, die verschiedene Nutzungen zulässt. Lediglich eine Tischtennisplatte und eine Picknickbank werden in diesen Bereich integriert.

#### Fragen und Anmerkungen seitens der Teilnehmenden

- Mehrere Teilnehmende loben den Entwurf. Sie bestätigen, dass alle Ideen aus der Beteiligung berücksichtigt und gut umgesetzt wurden.

steg Hamburg mbH im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord

- Ist für den Anger eine Beleuchtung vorgesehen?
  - Grünanlagen werden grundsätzlich nur in Ausnahmefällen beleuchtet. Da direkt an den Anger Wohngebäude angrenzen und eine Beleuchtung die Nutzung des Angers nach Sonnenuntergang begünstigen würde, was zu Konflikten mit den Nachbar:innen führen kann, ist eine Beleuchtung nicht vorgesehen. Mehrere Anwohner:innen bestätigen, dass eine Beleuchtung, auch der Tischtennisplatte, nicht erwünscht ist.
- Es wird darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich Trampelpfade auf dem Anger entstehen werden, da der Weg als Abkürzung beispielsweise zur Kita genutzt werden wird. Es wird daher vorgeschlagen, einen Weg über den Anger zu pflastern.
  - Herr Kinkel erläutert, dass die Bildung von Trampelpfaden nicht zu vermeiden ist, dies aber kein Problem darstellt. Auf einen gepflasterten Weg soll verzichtet werden, um die Grünfläche, die die einzige größere öffentliche Grünfläche im südlichen Pergolenviertel ist, durchgängig gestalten zu können.
- Kann der Wall mit bienenfreundlichen Blühpflanzen bepflanzt werden?
  - Aus Gründen der Grünpflege sollen auf dem Wall eine Gehölzpflanzung gepflanzt werden. Es wäre jedoch denkbar, vor dem Wall eine Blumenwiese anzulegen.
- Können zusätzliche Hochbeete angelegt werden?
  - Auf Hochbeete auf dem Anger soll verzichtet werden, da sich in den unmittelbar angrenzenden Kleingärten das Projekt Lokis Blumenwiese befindet, das vielfältige Möglichkeiten für nachbarschaftliches Gärtnern bietet.
- Wann wird die Planung des Angers umgesetzt?
  - Die Planung wird nach Abschluss der Straßenbauarbeiten am Feldahornweg umgesetzt.
- Durch einen Vertreter der Eigentümergemeinschaft BF 9 wird der Wunsch geäußert, den Wohnweg, der die Eingänge Feldahornweg 55 bis 61 erschließt, an den Saarlandstieg anzuschließen. Dort habe sich bereits ein Trampelpfad gebildet. Herr Kinkel sieht hier kein Problem. Das Quartiersmanagement stellt den Kontakt zum zuständigen Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung her.

## Spielplatz

Mit dem Bau des Spielplatzes soll im Frühjahr 2025 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2025 vorgesehen. Die Bepflanzung soll im Herbst erfolgen. Es gibt mehrere Faktoren, die leider zu einer Verzögerung beim Bau des Spielplatzes geführt haben. Zum einen gibt es personelle Engpässe im Bezirksamt, so dass nicht alle Projekte gleichzeitig bearbeitet werden können. Zum anderen mussten aufgrund von Vorgaben bei der Verwendung von Fremdmitteln andere Projekte in vorgegebenen Zeitfenstern bearbeitet werden. Für

andere Projekte wurde eine priorisierte Bearbeitung festgelegt. Schließlich führten auch Corona und der Ukrainekrieg zu massiven Preissteigerungen. Ein Bau in der Hochpreisphase war mangels ausreichender Finanzmittel nicht möglich.

Die Spielplatzplanung sieht verschiedene Spiel- und Bewegungsbereiche vor, die dem Plan im Anhang entnommen werden können (siehe auch PDF im Anhang).

Im südlichen Teil des Spielplatzes sind zwei Sportfelder für Fußball und Basketball vorgesehen. Westlich davon sind eine Parcours-Anlage (gelb) sowie zwei Tischtennisplatten geplant. Für den Bau der Parcours-Anlage hat Herr Kinkel zusätzliche Mittel eingeworben. Ob diese tatsächlich zur Verfügung gestellt werden können, entscheidet sich nach dem 15. November. Sollte dies nicht der Fall sein, wird auf die Parcours-Anlage verzichtet und die Tischtennisplatten werden in den Bereich verlegt. Der Standort der Tischtennisplatten wird dann als Grünfläche hergestellt. Grundsätzlich kann die Parcours-Anlage auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden, wenn entsprechende Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Der Bereich nördlich der Bewegungsangebote wird eingezäunt und gliedert sich in verschiedene Spielbereiche mit Angeboten für unterschiedliche Altersgruppen. Die genaue Ausführung der Spielgeräte entscheidet sich im Ausschreibungsverfahren, in dem den Spielgeräteherstellern entsprechende Anforderungen vorgegeben werden (z.B. Kletterbrücke über den Weg). Aufgrund des Geländeversprungs von ca. 4 m befinden sich die Spielbereiche auf unterschiedlichen Ebenen. Die Spielgeräte nehmen den Geländeversprung spielerisch auf, z.B. durch Rutschen und Kletterseile, die zum kreativen Spielen anregen. Ein gepflasterter, barrierearmer Weg verbindet die Spielbereiche untereinander. Außerdem sind verschiedene Spielgeräte vorgesehen, die auch von Kindern im Rollstuhl genutzt werden können (z.B. Rutsche, Sandspielplattform). Verschiedene Sitzmöglichkeiten und Picknickbänke bieten viel Raum zum Verweilen.

#### Fragen und Anmerkungen seitens der Teilnehmenden

- Mehrere Teilnehmende loben den Entwurf und würden eine Realisierung des Parcours, ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt, ebenfalls begrüßen. Es wird zugesagt, die Suche nach möglichen Fördermitteln zu unterstützen bzw. sich durch privates Engagement an der Finanzierung zu beteiligen.
- Werden Mülleimer aufgestellt?
  - Im Bereich der Bänke wird die Stadtreinigung Mülleimer aufstellen.

## **5. Aktuelles aus der „Aktivengruppe“**

Am 15. November wird der Verein „Leben im Pergolenviertel“ gegründet, der sich in Zukunft um viele Themen der Nachbarschaftsentwicklung kümmern wird.

Alle Nachbar:innen aus dem Pergolenviertel, die sich für Themen engagieren möchten, sind weiterhin herzlich eingeladen, sich in die Aktivengruppe einzubringen. Die Treffen finden immer am 15. des Monats um 19 Uhr im Quartiersbüro statt.

Am 15. Januar wird es einen großen Workshop geben, bei dem verschiedene Themen gesammelt werden, die im nächsten Jahr bewegt werden sollen. Auch diejenigen, die sich bisher noch nicht beteiligt haben, sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und Anregungen einzubringen. Die Gruppe ist bunt, vielfältig und voller Tatendrang!

## 6. Anträge an den Verfügungsfonds

Es liegt ein Antrag an den Verfügungsfonds vor.

### Antrag 07/2024                      „Bienenfreundliche Bepflanzung der Kübel vor d. Gemeinschaftsraum“

- Antragsteller:                      Grüne Wöhr e.V.
- beantragte Mittel:                      EUR 140,-

In der Baugemeinschaft Grüne Wöhr e.V. hat sich eine Gruppe Nachbar:innen zusammengefunden, die sich für eine bienenfreundliche Gestaltung der Außenanlagen einsetzt. Die Gruppe möchte nun in einem ersten Projekt die Blumenkübel auf der Gemeinschaftsterrasse des Gebäudes auf Baufeld 10 bepflanzen.

Abstimmungsergebnis:                      23 Ja-Stimmen                      1 Nein-Stimmen                      0 Enthaltungen

Der Antrag 07/2024 wird angenommen.

Für das laufende Jahr stehen im Verfügungsfonds noch 184,92 Euro zur Verfügung. Das letzte Forum in diesem Jahr, in dem Anträge gestellt werden können, findet am 10. Dezember statt. Im kommenden Jahr stehen wieder 2.500 Euro für nachbarschaftliche Projekte zur Verfügung.

## 7. Termine und Sonstiges

### Termine

- Das **nächste Forum Pergolenviertel** findet am 10. November um 18:30 Uhr statt.
  - Thema: u.a. aktuelle Informationen zur Parkraumbewirtschaftung im nördlichen Pergolenviertel durch den Landesbetrieb Verkehr.
  - Weitere Informationen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Bringen Sie gerne Ihre Themen ein!

### Sonstiges


Es wird auf eine verwaarloste Kleingartenparzelle östlich der Kleingartenanlage im südlichen Pergolenviertel hingewiesen. Es wird berichtet, dass sich dort häufig Obdachlose aufhalten und zudem eine Gefährdung für Kinder u.a. durch Glasscherben, die auch von der verfallenen Laube stammen, besteht. Die Parzelle befindet sich auf dem Grundstück der Deutschen Bahn und gehört somit nicht zum Kleingärtnerverein, die Zuständigkeit liegt bei der Bahn-Landwirtschaft. Der Kontakt zur Bahn-Landwirtschaft gestaltete sich in der Vergangenheit schwierig. Das Quartiersmanagement wird jedoch erneut Kontakt aufnehmen. Mehrere Teilnehmende sichern ihre Unterstützung bei der Beräumung der Laube zu, sofern eine Zustimmung der Bahn-Landwirtschaft erwirkt werden kann.

### **Bis zum nächsten Mal!**

Möchten Sie regelmäßig über aktuelle Themen und Termine im Pergolenviertel informiert werden? Dann tragen Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler für Bewohner:innen ein. Schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail an [pergolenviertel@steg-hamburg.de](mailto:pergolenviertel@steg-hamburg.de). Abonnieren Sie [hier](#) gerne auch unseren Newsletter.

---

steg Hamburg, 08.11.2024



# Herzlich willkommen zum Forum Pergolenviertel

5. November 2024, 18:30 Uhr | Loki-Schmidt-Platz 11

# PROGRAMM HEUTE

- 1.** Einführung
- 2.** Aktuelles aus dem Viertel
- 3.** Informationen zum Straßenbau Feldahornweg
- 4.** Planungen des Spielplatzes und des Angers
- 5.** Aktuelles aus der „Aktivengruppe“
- 6.** Verfügungsfonds
- 7.** Termine und Sonstiges



# 1 EINFÜHRUNG



## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL


Bericht vom Apfelfest am 21.09.



Fotos: Lukas Plessing

## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

Bericht von der „Frühblüher“-Pflanzaktion am 19.10.



Fotos: Nina Fischer

## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Bericht vom Bepflanzen der Hochbeete auf dem Loki-Schmidt-Platz



# 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

## PERIGON feiert Richtfest



## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Spendengelder an Mutter-Vater-Kind-Einrichtung übergeben



**Danke an alle  
Spenderinnen und  
Spender!**

## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Zukunft des mobilport



**mobilport**

## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

**Gibt es weitere aktuelle Infos  
aus der Nachbarschaft?**



# 3 STRAßENBAU IM FELDAHORNWEG

**Hr. Koenig**

**Bezirksamt Hamburg-Nord**

**Management des öffentlichen Raumes**



**Hamburg** | Bezirksamt  
Nord

# 4 PLANUNG SPIELPLATZ UND ANGER

**Hr. Kinkel**

**Bezirksamt Hamburg-Nord**

**Management des öffentlichen Raumes**



**Hamburg** | Bezirksamt  
Nord

# 5 AKTUELLES AUS DER „AKTIVENGRUPPE“

## Treffen der „Aktivengruppe“

immer am 15. des Monats

Beginn 19 Uhr

Quartiersbüro (Winterlindenweg 34)

## Gründungssitzung

Verein „Leben im Pergolenviertel“

15. November 2024, 17:00 Uhr

Quartiersbüro



# 6 VERFÜGUNGSFONDS

## Verfügungsfonds Pergolenviertel

### Wer kann einen Antrag stellen?

Privatpersonen, Gewerbetreibende, Eigentümer:innen, Vereine, Institutionen und Initiativen im Pergolenviertel

### Welche Projekte können gefördert werden?

- Förderfähig sind Projekte bis zu 500 Euro,
- die nachbarschaftliche Kontakte stärken,
  - Begegnungen ermöglichen,
  - Netzwerke unterstützen.

Die Projekte sollen dem Quartier zugute kommen.

**Geld für kleine  
Projekte in der  
Nachbarschaft**

**In diesem Jahr  
stehen noch  
324,92 € zur  
Verfügung!**

# 6 VERFÜGUNGSFONDS

## ANTRAG 07/2024

---


Projekt: Bienenfreundliche Bepflanzung

Antragstellerinnen: Sabine Hübner, Sarah Kegat, Anja Klische

beantragte Mittel: **EUR 140,00**

Eigen-/Drittmittel: -

Gesamtkosten: EUR 140,00



## 6 TERMINE UND SONSTIGES

### Nächstes Forum Pergolenviertel

**10. Dezember 2024, 18:30 Uhr**



Aktuelle Infos zur Parkraumbewirtschaftung (LBV)

vsl. als Videokonferenz mit anschließendem Get-Together als weihnachtlicher Jahresausklang

Weitere Themen und Details werden rechtzeitig bekanntgegeben.



## 6 TERMINE UND SONSTIGES

**Haben Sie weitere Themen / Fragen / Anregungen?**



**ENDE**

**Schön, dass Sie dabei waren!**

E-Mail: [pergolenviertel@steg-hamburg.de](mailto:pergolenviertel@steg-hamburg.de)

Web: [www.pergolenviertel.hamburg](http://www.pergolenviertel.hamburg)

Tel: (040) 43 13 93 - 46 / 63

Sprechzeiten:

dienstags 9:00 – 11:00 Uhr

donnerstags 16:00 – 18:00 Uhr

Quartiersbüro Winterlindenweg 34



# BAUAUSFÜHRUNG PERGOLENVIERTEL SÜD



Foto: Heiner Müller-Eisner

## Feldahornweg & Querung Alte Wöhr

05.11.2024 | Hamburg

# WAS WIRD VORGESTELLT

1. ALLGEMEINES ZUM BAUABLAUF

2. BAUABLAUF DETAILLIERT



# WICHTIGSTE FAKTEN

- BAUSTART: ANFANG 2025
- BAUZEIT: CA. 25 WOCHEN
- PRIORITÄRE BEHANDLUNG DER MAßNAHME
- NÄCHSTER SCHRITT: AUSSCHREIBUNG DER BAULEISTUNGEN

# WARUM WIRD NOCH NICHT GEBAUT?

- FERTIGSTELLUNG DES HOCHBAUS
- FERTIGSTELLUNG PERGOLENVIERTEL NORD
- VERSCHIEDENE UMPLANUNGEN ERFORDERLICH
  - z. B. Höhen an den Anschlüssen zum Hochbau, Elemente zur Erhöhung der Barrierefreiheit
- ABSTIMMUNGEN MIT VERSCHIEDENEN FIRMEN / PERSONEN / DIENSTSTELLEN
  - Parallel laufende Projekte auf allen Ebenen
  - Umlaufzeiten
- PERSONALMANGEL/KRANKHEIT/URLAUB

# BAUABLAUF

## ABLAUF – GRUNDSÄTZLICHES (1)

- Vorgaben zum Ablauf vom Bezirksamt
- Abhängigkeiten
  - Baufirma/Baufortschritt
  - Witterung
  - Bebaute Umgebung
- Fertigstellung von Nord nach Süd
  - keine Befahrung bereits fertiggestellter Flächen
- Grundsätzlich zunächst Herstellung der Nebenflächen

# BAUABLAUF


## ABLAUF – GRUNDSÄTZLICHES (2)

- Endgültiger Bauablauf wird mit Baufirma und ggf. Polizei abgestimmt
- Regelmäßig unter Aufrechterhaltung des Kfz-Verkehrs
  - Unvermeidliche Vollsperrungen werden frühzeitig kommuniziert
  - Fertigstellung der Fahrbahn unter abschnittsweiser Vollsperrung
- Gesicherte Führung des Fußverkehrs

# BAUABLAUF – DETAILLIERT (1)

## WAS IST BEREITS „FERTIGGESTELLT“?


- Leitungen und Siele
  - Ausnahme: zusätzliche Stromtrasse im Süden
- Unterbau der Fahrbahn
  - Tragschicht überhöht und verbreitert hergestellt
- Flächen im Bereich von BF 7
  - Anpassungen erforderlich

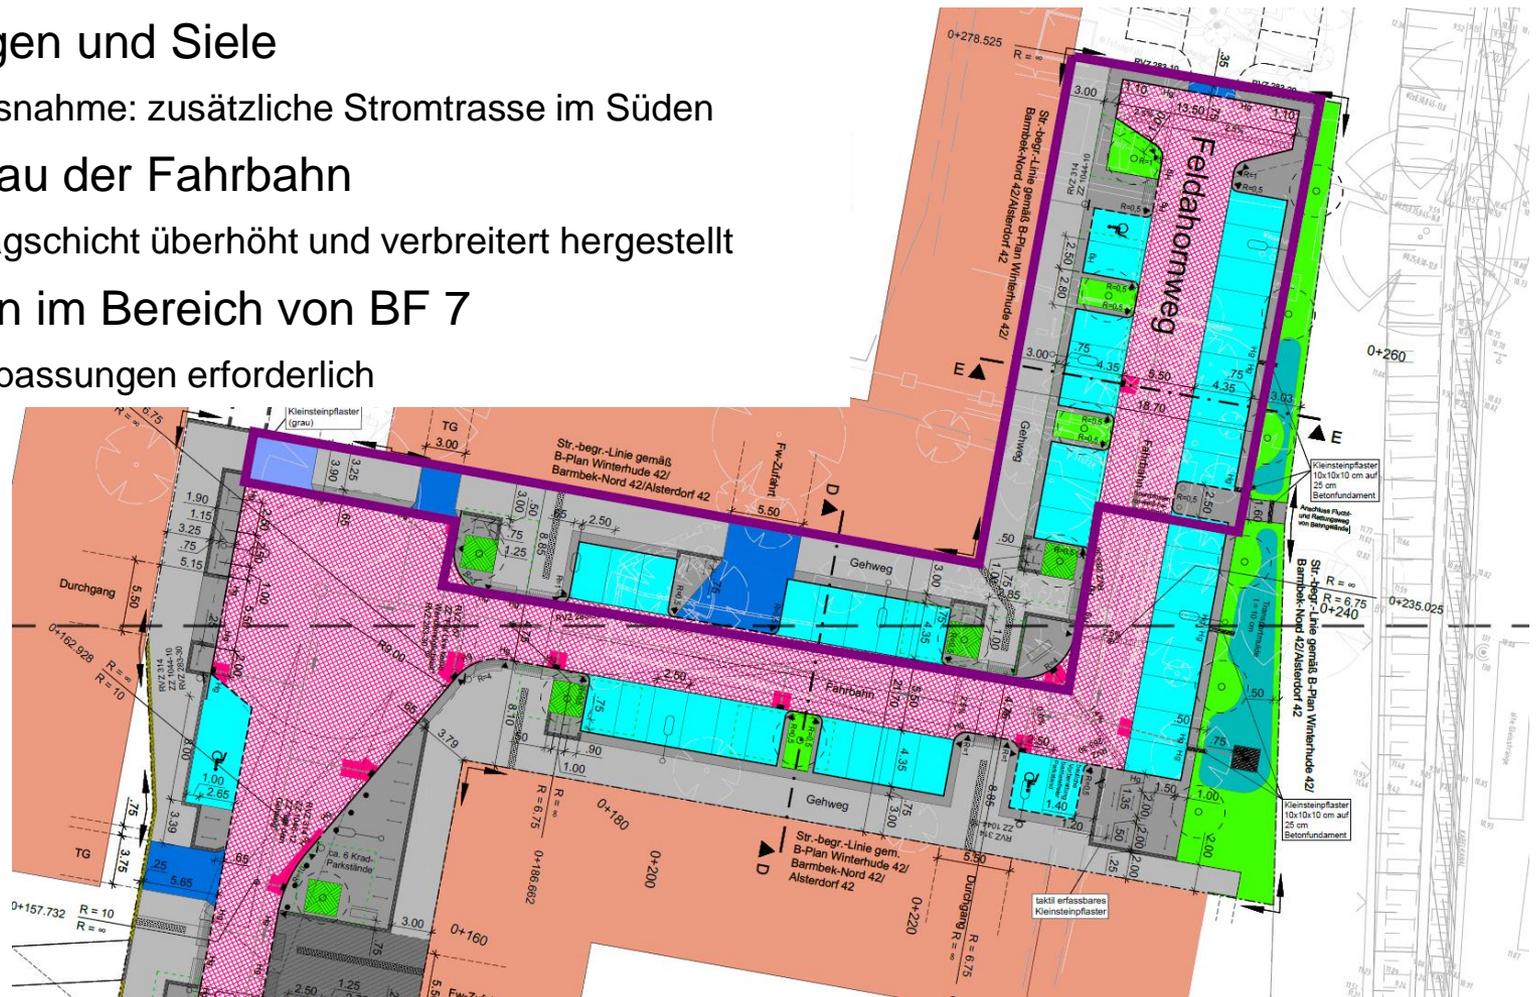

# BAUABLAUF – DETAILLIERT (2)

## BEREICH ÖSTLICH DES WENDEHAMMERS


- Fräsen/Schneiden der vorhandenen Fahrbahn
- Herstellen der Nebenflächen nördlich von BF 8
- Durchfahrt zu KGV wird gewährleistet
- Ggf. Fertigstellung der Fahrbahn in Teilbereich

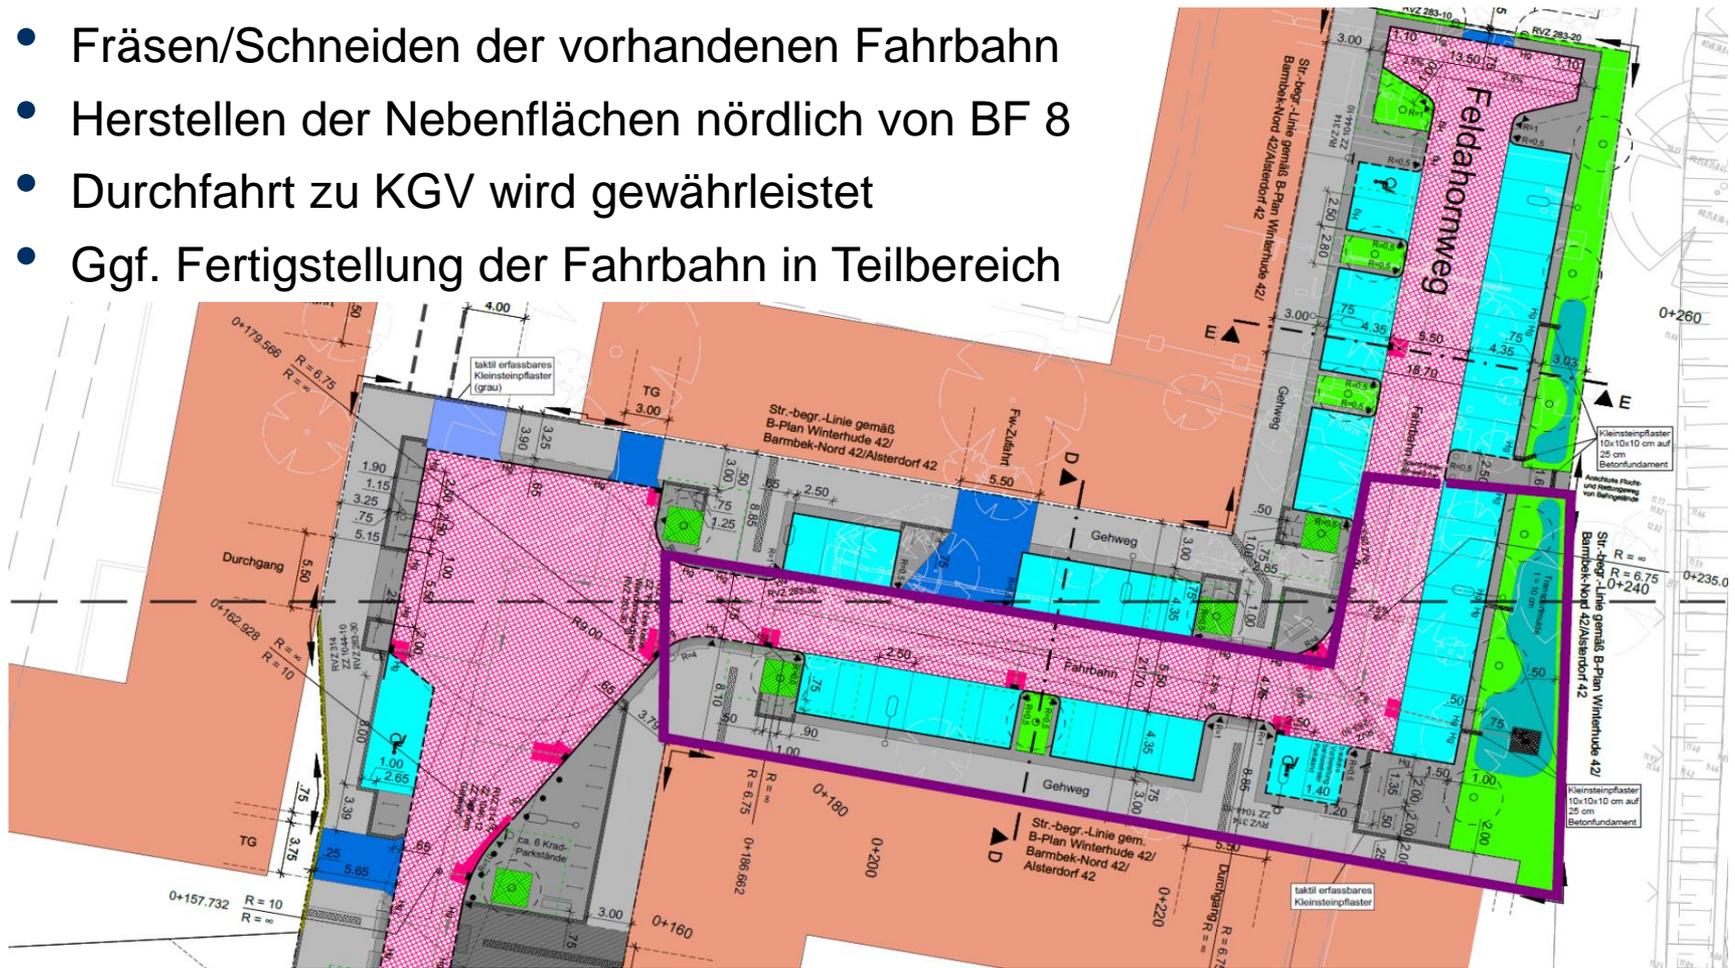

# BAUABLAUF – DETAILLIERT (3)

## KURVE BIS WENDEANLAGE


- Fräsen/Schneiden der vorhandenen Fahrbahn
- Herstellen der Nebenflächen von Wendehammer bis zur Kurve zw. BF 8 und 10
- Genaue Grenzen werden durch Baufirma festgelegt
- Durchfahrt zu KGV wird gewährleistet
- Ggf. Fertigstellung der Fahrbahn in Teilbereich

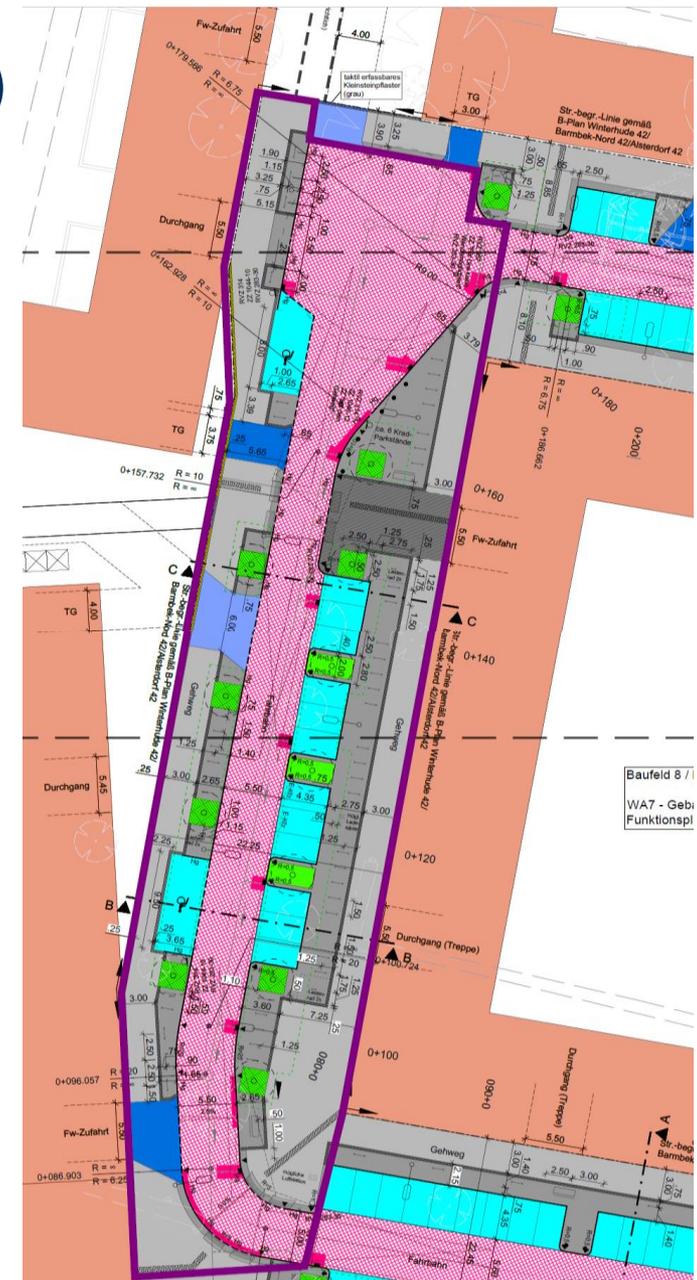

# BAUABLAUF – DETAILLIERT (4)

## KURVE BIS ALTE WÖHR


- Herstellen der Nebenflächen im südlichen Feldahornweg inkl. Treppen-/Rampenanlage
- Herstellen der Nebenflächen nördlich der Alten Wöhr – Sperrung mit Umleitung über die südliche Fahrbahnseite
- Fertigstellung der Fahrbahn Feldahornweg

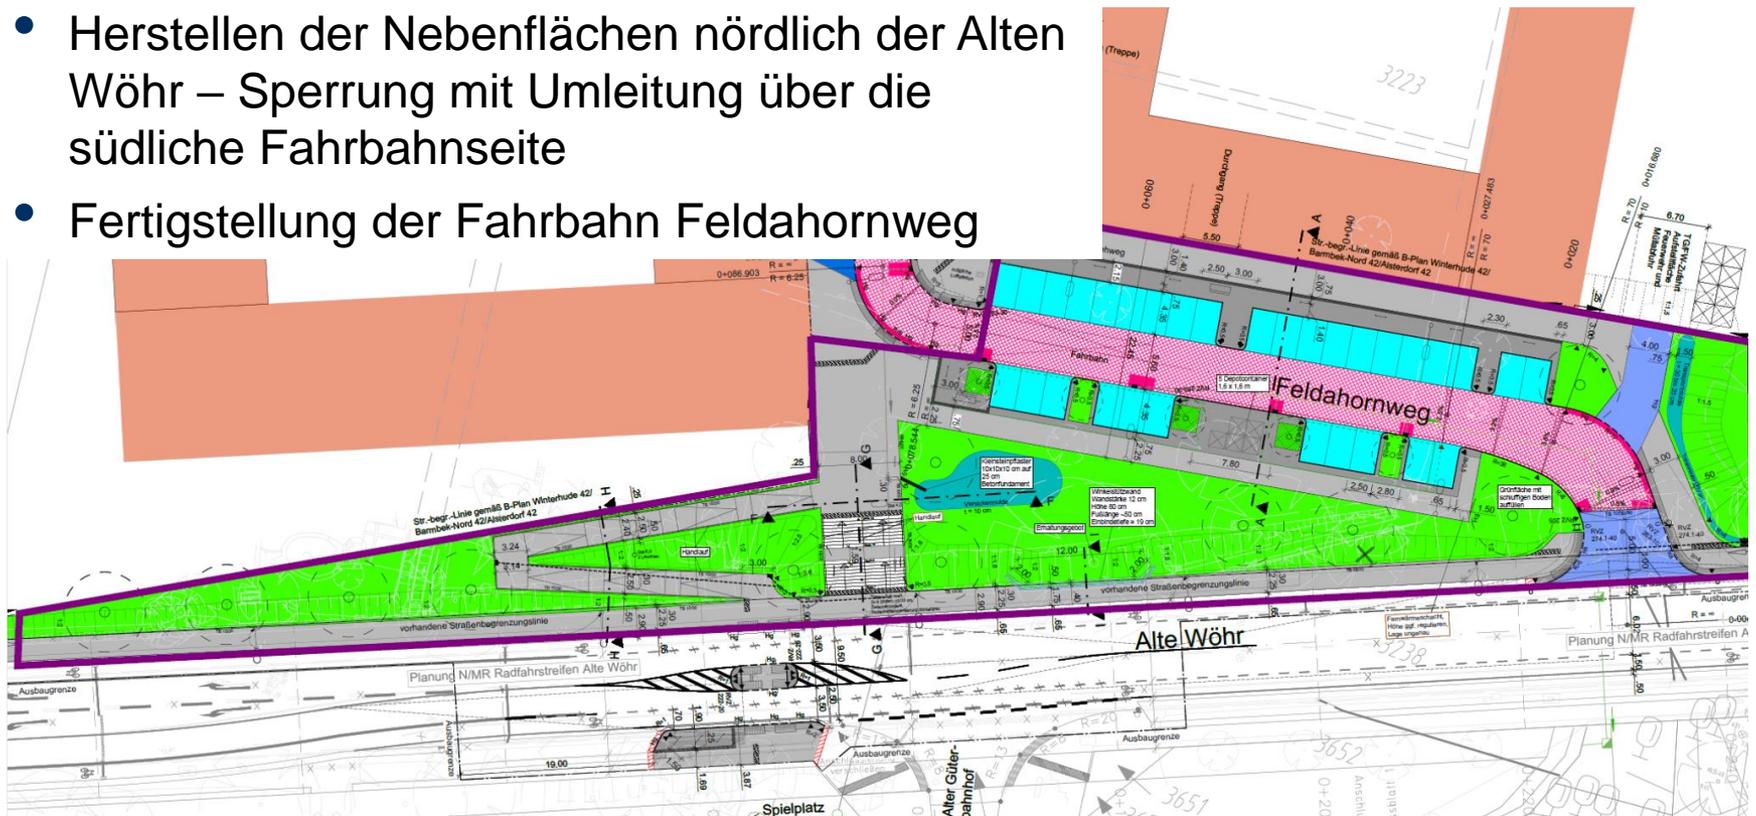

# BAUABLAUF – DETAILLIERT (5)

## QUERUNG ALTE WÖHR

- Zuerst Fertigstellung der Nebenfläche auf der südlichen Seite
- Abschließend Herstellen der Mittelinsel unter Vollsperrung der Alten Wöhr – abhängig von Baustellen/Sperrungen in der Umgebung

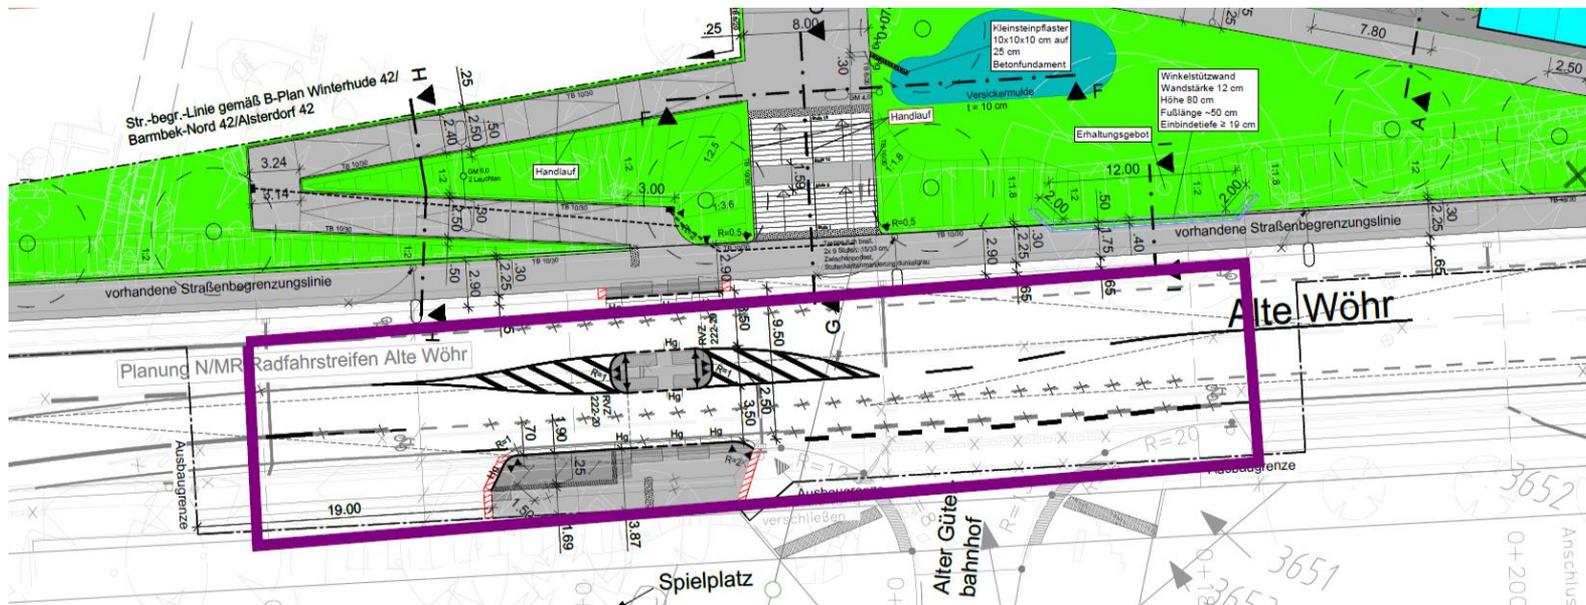

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**



Bezirksamt  
Hamburg-Nord

Liegewiese

DB-Gelände

Ausgleichsfläche für Naturschutz Rückzugsort für Wildtiere

